


伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.1)

項目	内容
主要工程	<ul style="list-style-type: none"> ・2月22日 20時20分 負荷降下開始 ・2月23日 0時20分 送電停止 (第16回定検開始) ・2月23日 2時20分 原子炉停止
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 3月6日より原子炉容器の開放作業開始予定 ・燃料関係 3月13日より燃料取出作業開始予定 (3月15日終了予定) ・タービンおよび発電機 2月23日よりタービンや発電機の点検を開始
今定検の主要工事	<ul style="list-style-type: none"> ・187kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事 ・1次系配管取替え工事

伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

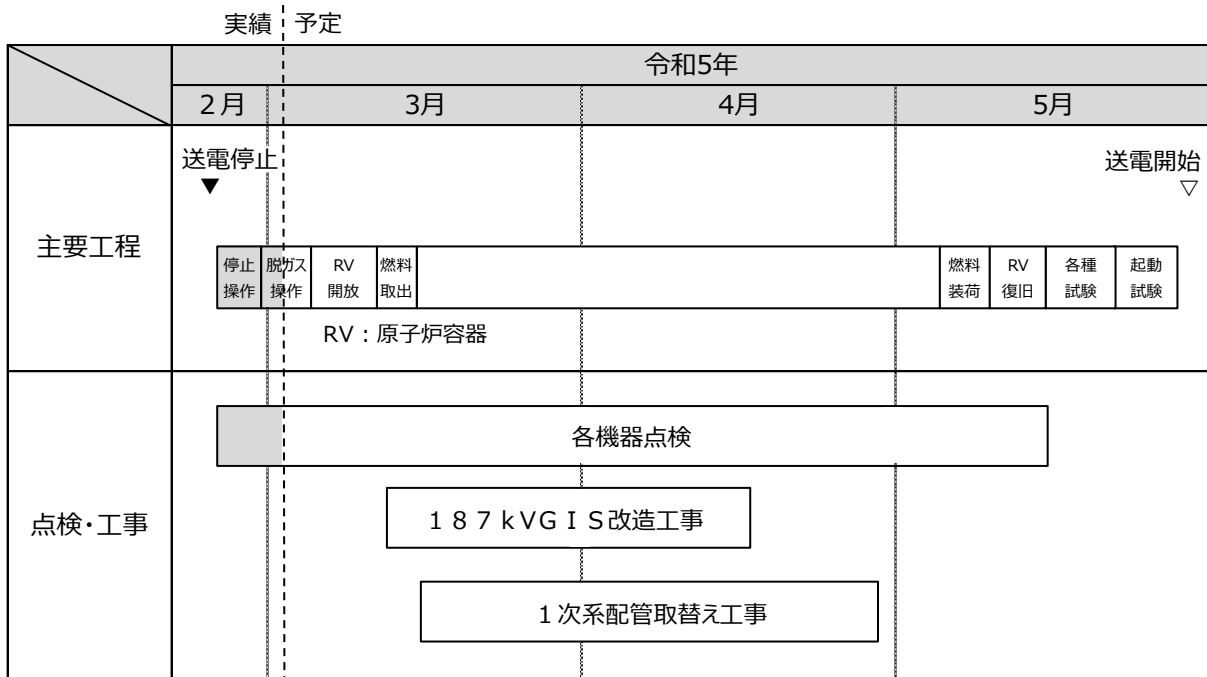

次回報告は、3月15日の予定

定検状況写真



タービン点検（蒸気配管吊上）作業状況（タービン建屋内 2月24日撮影）
