

## 伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.2)

項目	内容
主要工程	3月13日 燃料取出作業開始 3月15日 燃料取出作業完了
主要機器の点検状況	・原子炉関係 炉内構造物吊出完了 ・タービンおよび発電機 各機器点検中 ・燃料関係 3月18日 燃料検査開始予定
主要工事の状況	・187kVガス絶縁開閉装置(GIS)改造工事 GISユニット改造中

### 伊方3号機第16回定検工程表(予定)

	実績   予定													
	2月		3月				4月				5月			
主要工程	送電停止 ▼												送電開始 ▽	
	停止操作	脱ガス操作	RV開放	燃料取出					燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験		
	RV: 原子炉容器													
点検・工事	各機器点検													
	187kV GIS改造工事													
	1次系配管取替え工事													


次回報告は、3月29日の予定

(添付)

## 定検状況写真



タービン点検（ロータ吊上）作業状況（タービン建屋内 3月4日撮影）

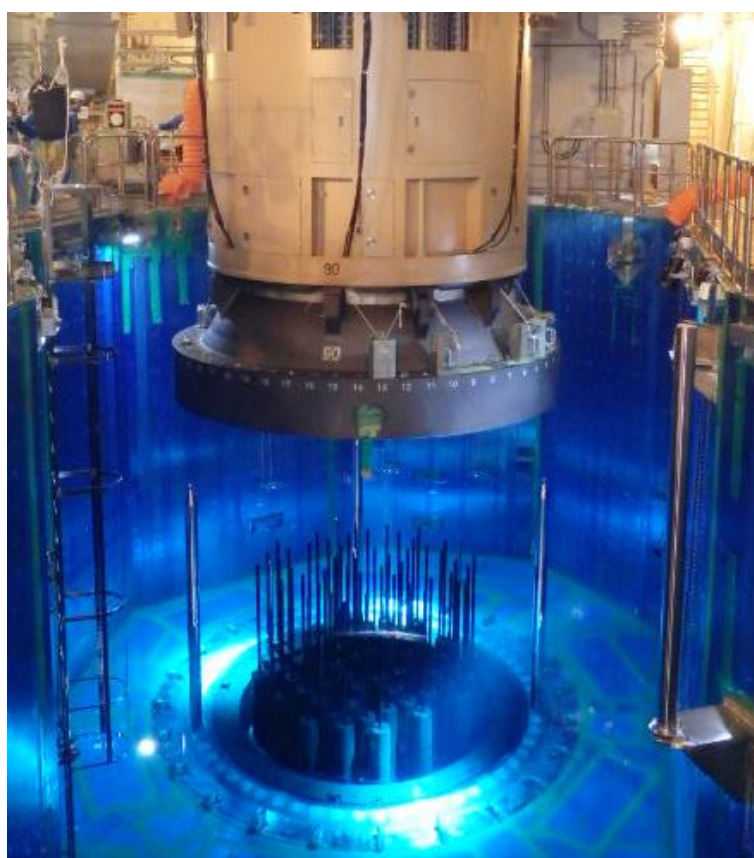

原子炉容器開放作業状況（原子炉格納容器内 3月11日撮影）
