

伊方発電所3号機第16回定検状況報告 (No.6)

項目	内容
主要工程	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料装荷作業完了 5月4日 作業開始 5月6日 作業完了 ・原子炉容器復旧中
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・タービンおよび発電機 各機器点検中
主要工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・187kVガス絶縁開閉装置 (GIS) 改造工事 工事完了 ・1次系配管取替え工事 配管取替え後の検査を実施中


伊方3号機第16回定検工程表 (予定)

	令和5年								実績	予定										
	2月	3月			4月			5月												
主要工程	送電停止 ▼									送電開始 ▽										
	<table border="1"> <tr> <td>停止 操作</td> <td>脱ガス 操作</td> <td>RV 開放</td> <td>燃料 取出</td> <td colspan="3"></td> <td>燃料 装荷</td> <td>RV 復旧</td> <td>各種 試験</td> <td>起動 試験</td> </tr> </table>	停止 操作	脱ガス 操作	RV 開放	燃料 取出				燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験	起動 試験	RV : 原子炉容器							
停止 操作	脱ガス 操作	RV 開放	燃料 取出				燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験	起動 試験										
点検・工事	各機器点検																			
	187kV GIS改造工事																			
	1次系配管取替え工事																			

次回報告は、5月24日の予定

(添付)

定検状況写真

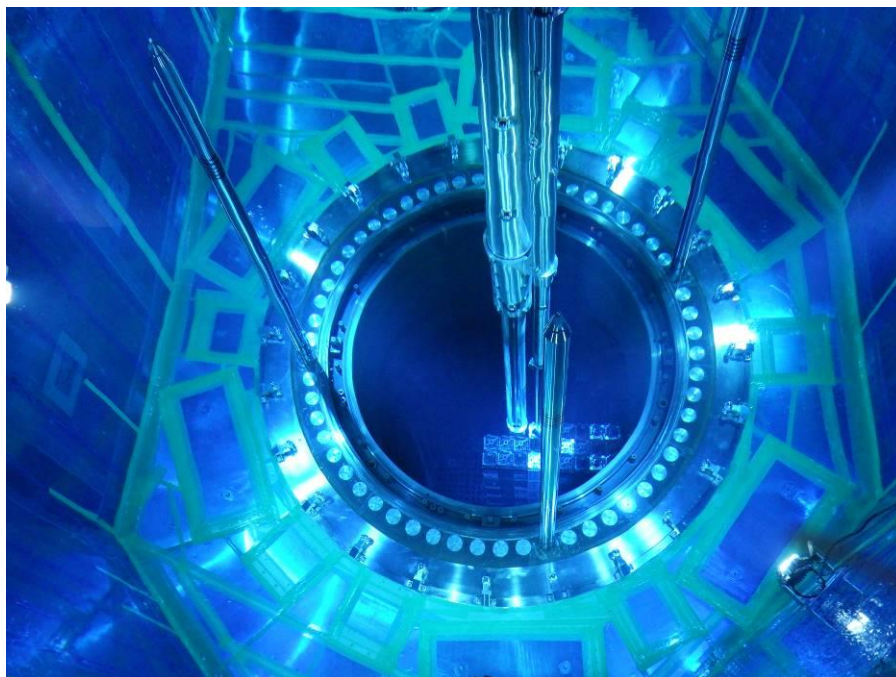

燃料装荷作業状況（原子炉格納容器内 5月4日撮影）



循環水ポンプ点検（試運転）作業状況（屋外 4月26日撮影）
