伊方発電所3号機第18回定検状況報告(No.1)


| 項目 | 内 容 | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 主要工程 | ・10月10日 20時20分 負荷降下開始 ・10月11日 0時20分 送電停止(第18回定検開始) ・10月11日 2時23分 原子炉停止 | | | | | |
| 主要機器の 点検状況 | ・原子炉関係 10月13日に原子炉容器の開放作業を開始し、10月20日に完了 ・燃料関係 10月20日に燃料取出作業を開始し、10月23日に完了 ・タービンおよび発電機 10月13日よりタービンや発電機の点検を開始 | | | | | |
| 今定検の 主要工事 | ・1 次系弁取替工事 | | | | | |

伊方3号機第18回定検工程表(予定)

| | 実績 | ¦ 子 | 定 | | | | |
|-------|--|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | 10月 | | 11月 | 12月 | | | |
| 主要工程 | 送電停止 ▼ | | | | | | 送電開始 ▽ |
| | 停止 RV 燃料 操作 開放 取出 RV:原子炉容器 | | | 然料 長荷 | RV 復旧 | 各種 試験 | 起動試験 |
| 点検·工事 | | | G 100 DD 1-10 | | | | |
| | | | 各機器点検 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1次系弁取替工事 | | | | |
| | | I I | | | | | |

次回報告は、11月19日の予定

定検状況写真

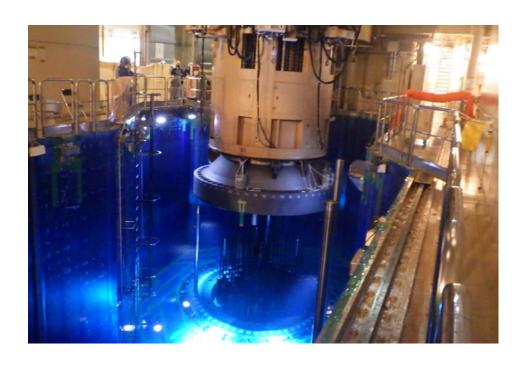

原子炉容器開放(上蓋吊上)作業状況(原子炉格納容器内 10月19日撮影)



タービン点検(低圧タービンロータ吊出)作業状況(タービン建屋内 10月20日撮影)
