

伊方発電所3号機第17回定検状況報告 (No.2)

項目	内容
主要工程	<ul style="list-style-type: none"> ・7月30日 燃料取出作業開始 ・8月 2日 燃料取出作業完了
主要機器の点検状況	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉関係 各機器点検中 ・燃料関係 燃料検査完了 ・タービンおよび発電機 各機器点検中
主要工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・火災防護対策工事 火災感知器の追設、電線管等への耐火材施工作業中


伊方3号機第17回定検工程表 (予定)

	実績		予定											
	7月	8月	8月	9月										
主要工程	<p>送電停止 ▼</p> <table border="1"> <tr> <td>停止操作</td> <td>RV開放</td> <td>燃料取出</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料装荷</td> <td>RV復旧</td> <td>各種試験</td> <td>起動試験</td> </tr> </table> <p>RV：原子炉容器</p>	停止操作	RV開放	燃料取出				燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験			<p>送電開始 ▽</p>
停止操作	RV開放	燃料取出				燃料装荷	RV復旧	各種試験	起動試験					
点検・工事			各機器点検											
			火災防護対策工事											

次回報告は、8月28日の予定

(添付)

定検状況写真

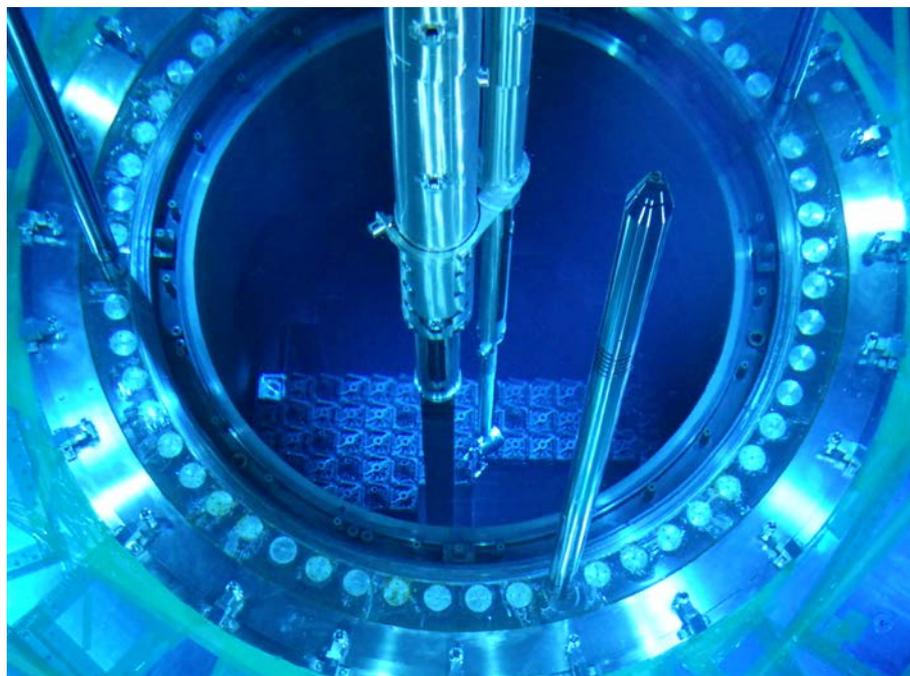

燃料取出作業状況（原子炉格納容器内 8月1日撮影）



海水ポンプ※点検（ポンプ吊出）作業状況（屋外 8月4日撮影）

※：非常用ディーゼル発電機等の補機を冷却するための海水を送水するポンプ。
