

伊方発電所 3 号機第 1 8 回定検状況報告（No.3）


項目	内 容
主要工程	・燃料装荷作業完了（11月28日～11月30日） ・原子炉容器復旧作業完了（12月2日～12月8日）
主要機器の 点検状況	・機械設備 非常用ディーゼル発電機等の各機器点検中および各種試験実施中 ・電気、計装設備 電動機、計装品等の各機器点検完了し、各種試験実施中
今定検の 主要工事	・1次系弁取替工事 工事完了

伊方 3 号機第 1 8 回定検工程表（予定）

		実績				予定		
	10月		11月			12月		
主要工程	送電停止 ▼					送電開始 ▽		
	停止 操作	RV 開放	燃料 取出		燃料 装荷	RV 復旧	各種 試験	起動 試験
	RV：原子炉容器							
点検・工事	各機器点検							
	1次系弁取替工事							

(添付)

定検状況写真

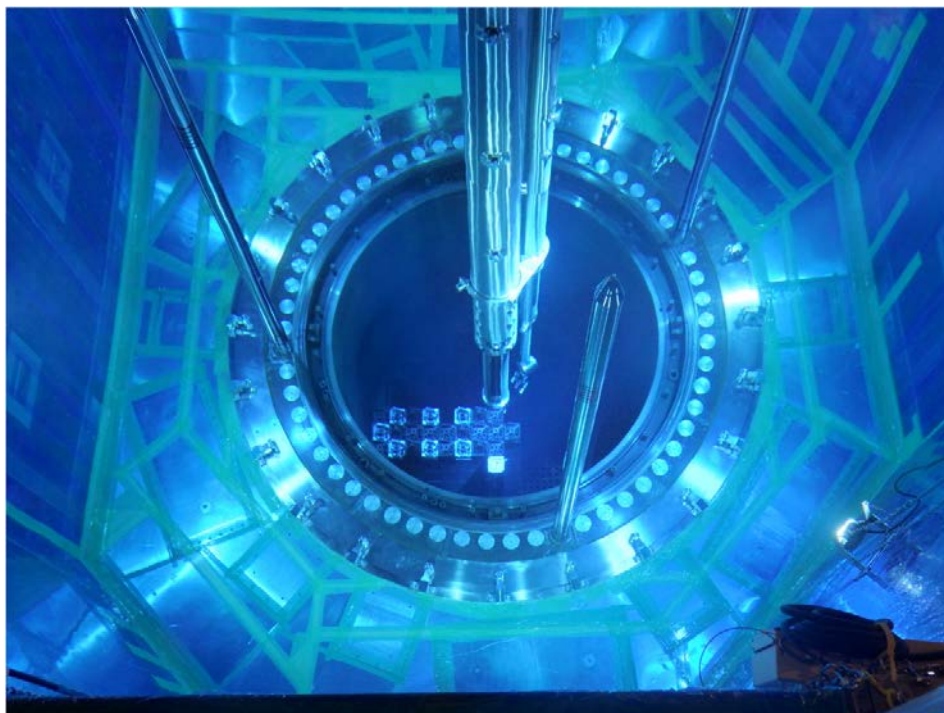

燃料装荷作業状況（原子炉格納容器内 11月29日撮影）



原子炉容器上蓋吊込み作業状況（原子炉格納容器内 12月2日撮影）
