

2026年度変電・給電工事

| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|------------------|---------|---|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-1 | 愛媛支社 | 新居浜変電所 No. 3配電用変圧器上屋外鉄構塗装 | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-2 | 徳島支社 | 井川変電所 No. 1連系用変圧器1次ガス絶縁開閉装置および3次配電箱基礎工事 | B | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/09 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-3 | 香川支社 | 高松変電所 187kV鉄構塗装修繕 | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-4 | 愛媛支社 | 今治変電所 No.1・2バンク逆潮流対策工事 | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-5 | 愛媛支社 | 三島変電所 三島連絡線保護継電装置取替 | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-6 | 愛媛支社 | 朝日町変電所 三島連絡線保護継電装置取替 | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-7 | 徳島支社 | 阿南変換所 橋湾系緊急制御装置取替(Ⅱ期) | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-8 | 徳島支社 | 阿波変電所 橋湾系緊急制御装置取替(Ⅱ期) | A | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-9 | 香川支社 | 讃岐変電所 讃岐鳴門線1・2L遮断器他取替 | C | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/07 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-10 | 徳島支社 | K変電所 No. 3バンク仮供給工事 | B | 2026/3/10 | 2026/04 | 2026/08 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-11 | 高知支社 | I変電所 No. 1配電箱増設 | A | 2026/3/15 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-12 | 高知支社 | 立田変電所 No. 1避雷器取替 | A | 2026/3/15 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-13 | 高知支社 | 香我美変電所 受電盤他取替 | B | 2026/3/15 | 2026/04 | 2026/06 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-14 | 高知支社 | 高知変電所 No. 1・2電力用コンデンサ他取替 | D | 2026/3/15 | 2026/04 | 2026/06 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-15 | 愛媛支社 | 枝堀変電所 No. 3配電用変圧器ラジエータ塗装修繕 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-16 | 高知支社 | 戸内変電所 正門取替 | B | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-17 | 香川支社 | 豊浜変電所 線路用・母線用計器用変圧器取替 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-18 | 高知支社 | 須崎変電所 No. 2配電箱他取替 | C | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-19 | 愛媛支社 | 中野変電所 66kV計器用変圧器・避雷器取替 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-20 | 愛媛支社 | 中野変電所 受電盤・所内盤取替 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-21 | 愛媛支社 | 中野変電所 No. 3変圧器制御保護盤、22kV配電線保護盤取替 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-22 | 愛媛支社 | 中野変電所 中野支線1・2L線路開閉器取替 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-23 | 愛媛支社 | 松山変電所 No. 2・4電力用コンデンサ設置 | B | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-24 | 愛媛支社 | 山際変電所 遮断器取替 | B | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/08 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-25 | 愛媛支社 | 宇和島変電所 No. 1配電箱取替 | B | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/08 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-26 | 愛媛支社 | 宇和島変電所 遠方監視制御装置取替 | B | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/08 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-27 | 愛媛支社 | 枝堀変電所 No. 3配電用変圧器ラジエータ塗装 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-28 | 愛媛支社 | 丹原変電所 No. 1配電用変圧器ラジエータ塗装 | A | 2026/3/15 | 2026/05 | 2026/07 | 2026/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-29 | 系統運用部 | 三島変電所 総合保護装置 総合研修所へ移設 | A | 2026/3/20 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-30 | 愛媛支社 | 竹原変電所 遠方監視制御装置他取替 | B | 2026/4/1 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-31 | 徳島支社 | 田宮変電所 No. 1配電用変圧器取替 | B | 2026/4/1 | 2026/06 | 2026/08 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-32 | 徳島支社 | 阿南火力変電所 187kVガス絶縁開閉装置取替(電気工事) | D | 2026/4/1 | 2026/06 | 2026/08 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-33 | 徳島支社 | 赤石変電所 小松島太陽光線遮断器他取替 | B | 2026/4/1 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |

| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|------------------|---------|--|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-34 | 徳島支社 | 井川変電所 旧三野変電所 No. 1 配電用変圧器搬出作業 | A | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-35 | 愛媛支社 | 西条変電所 187kV移動用変圧器除却 | A | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/09 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-36 | 愛媛支社 | 朝日町変電所 ガス絶縁開閉装置取替(除却) | B | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-37 | 香川支社 | 琴平変電所 No. 2 母線計器用変圧器取替 | A | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-38 | 香川支社 | 高松変電所 No. 1 連系用変圧器3次配電箱他取替 | B | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-39 | 愛媛支社 | 若宮変電所 受電盤取替 | A | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-40 | 徳島支社 | 三野変電所 配電盤取替 | A | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/09 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-41 | 徳島支社 | 井川変電所 No. 1 連系用変圧器1次ガス絶縁開閉装置および3次配電箱取替工事 | C | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/09 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-42 | 愛媛支社 | 大洲変電所 連系用変圧器1次他線路開閉器取替 | B | 2026/4/15 | 2026/06 | 2026/10 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-43 | 愛媛支社 | 松山変電所 No. 2 連系用変圧器除却 | C | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/09 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-44 | 徳島支社 | 田宮変電所 ガス絶縁開閉装置取替(Ⅱ期) | B | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/09 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-45 | 徳島支社 | K変電所 No. 3 配電用変圧器取替 | B | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/10 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-46 | 徳島支社 | K変電所 No. 3 配電箱取替 | B | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/10 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-47 | 徳島支社 | K変電所 No. 3 変圧器制御保護盤取替 | A | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/10 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-48 | 徳島支社 | A変電所 No. 4 配電用変圧器増設(Ⅰ期) | B | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/10 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-49 | 徳島支社 | 鷲敷変電所 No. 1バンク逆潮流対策 | A | 2026/5/1 | 2026/07 | 2026/11 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-50 | 香川支社 | 善通寺変電所 善通寺線保護継電装置取替 | A | 2026/5/1 | 2026/07 | 2027/01 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-51 | 香川支社 | 松島変電所 松島東浜線保護継電装置設置 | A | 2026/5/1 | 2026/07 | 2027/01 | 2028/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-52 | 香川支社 | 東浜変電所 松島東浜線保護継電装置設置 | A | 2026/5/1 | 2026/07 | 2027/01 | 2028/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-53 | 香川支社 | 香東変電所 ガス絶縁開閉装置塗装修繕 | A | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/09 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-54 | 愛媛支社 | 新居浜変電所 No. 1 配電用変圧器取替 | B | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-55 | 愛媛支社 | 新居浜変電所 No. 1 配電用変圧器仮供給工事 | B | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-56 | 愛媛支社 | 川之江変電所 No. 3 配電箱取替 | B | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-57 | 香川支社 | K変電所 No. 5 配電用変圧器取替 | B | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-58 | 高知支社 | 旭変電所 No. 2 配電用変圧器他取替 | B | 2026/5/15 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-59 | 徳島支社 | 鳴門変電所 連系用変圧器過負荷保護装置取替 | A | 2026/6/1 | 2026/07 | 2026/09 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-60 | 愛媛支社 | 湯山変電所 避雷器取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-61 | 徳島支社 | 上浦変電所 No. 2 配電箱内変圧器2重化 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-62 | 徳島支社 | 田宮変電所 No. 1 配電箱内2重化 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-63 | 愛媛支社 | 衣山変電所 衣山支線1L避雷器取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-64 | 愛媛支社 | 浅川変電所 No. 1 電力用コンデンサ盤取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-65 | 愛媛支社 | 柳谷開閉所 母線用計器用変圧器取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-66 | 愛媛支社 | 柳谷開閉所 制御ケーブル取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-67 | 愛媛支社 | 松山変電所 枝松線2L計器用変圧器取替 | A | 2026/6/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |


| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|-------------------|---------|---------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-68 | 高知支社 | 高知変電所 No. 4 連系用変圧器ラジエータ他塗装修繕 | A | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/10 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-69 | 高知支社 | 宿毛変電所 宿毛線 1 L 線路開閉器他取替 | B | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-70 | 香川支社 | 由佐変電所 66kV 鉄構塗装修繕 | A | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-71 | 香川支社 | 観音寺変電所 No. 2 配電用変圧器他取替工事 | C | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-72 | 徳島支社 | 阿南変換所 操作箱他塗装修繕 | B | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/11 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-73 | 徳島支社 | 林変電所 遠方監視制御装置取替 | B | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/11 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-74 | 愛媛支社 | 大浦変電所 母線用計器用変圧器取替 | A | 2026/6/15 | 2026/08 | 2026/11 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-75 | 愛媛支社 | 宇和島変電所 御荘線過負荷検出装置設置 | A | 2026/7/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-76 | 愛媛支社 | 山際変電所 御荘線過負荷検出装置設置 | A | 2026/7/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-77 | 愛媛支社 | 岩松変電所 御荘線過負荷検出装置設置 | A | 2026/7/1 | 2026/08 | 2026/10 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-78 | 徳島支社 | 阿南火力内変電設備 No. 1 連系用変圧器ラジエータ塗装修繕 | A | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2026/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-79 | 高知支社 | 津賀変電所 線路用・母線用計器用変圧器、避雷器取替 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-80 | 香川支社 | 讃岐変電所 No. 4 連系用変圧器防音室屋上防水修繕 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-81 | 徳島支社 | 蔵本変電所 ガス絶縁開閉器塗装修繕 | A | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-82 | 香川支社 | 大内変電所 計器用変圧器取替 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-83 | 愛媛支社 | 大洲変電所 丙丁母線区分他ガス絶縁開閉装置塗装修繕 | A | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-84 | 愛媛支社 | H変電所 No. 1 配電用変圧器取替 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/12 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-85 | 愛媛支社 | 保内変電所 保内線遮断器取替 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/12 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-86 | 愛媛支社 | 保内変電所 No. 1 配電箱取替 | B | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/12 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-87 | 愛媛支社 | 保内変電所 受電盤取替 | A | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/12 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-88 | 愛媛支社 | 保内変電所 避雷器取替 | A | 2026/7/15 | 2026/09 | 2026/12 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-89 | 香川支社 | 松島変電所 ガス絶縁開閉装置取替 (I期) | C | 2026/7/15 | 2026/09 | 2027/01 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-90 | 徳島支社 | 国府変電所 阿南火力線1Lガス絶縁開閉器塗装修繕 | A | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-91 | 徳島支社 | 国府変電所 阿南火力線 1 L ガス絶縁開閉器塗装修繕 | A | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-92 | 徳島支社 | 大津変電所 No. 2 配電用変圧器ラジエータ塗装修繕 | A | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-93 | 徳島支社 | 末広変電所 受電盤他取替 | A | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-94 | 徳島支社 | 末広変電所 所内盤取替 | A | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-95 | 徳島支社 | 雑賀変電所 カメラ・センサ他設置 | B | 2026/8/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-96 | 愛媛支社 | 三島変電所 鉄構塗装 (母線連絡区画) | A | 2026/8/15 | 2026/10 | 2026/12 | 2026/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-97 | 香川支社 | 林田変電所 No. 3 配電箱他取替 | B | 2026/8/15 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-98 | 愛媛支社 | 御荘変電所 No. 3 配電用変圧器塗装修繕 | A | 2026/8/15 | 2026/10 | 2027/01 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-99 | 系統運用部 | 中給 給電装置電源盤および分電盤取替 | B | 2026/8/20 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/03 | 変電・給電-工事 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-100 | 愛媛支社 | 原町変電所 保護継電装置設置 | A | 2026/9/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-101 | 愛媛支社 | 郡中変電所 保護継電装置設置 | A | 2026/9/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |

| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|-------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-102 | 愛媛支社 | 若宮変電所 保護継電装置設置 | A | 2026/9/1 | 2026/10 | 2026/12 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-103 | 愛媛支社 | 春日変電所 春日線電力ケーブル除却 | A | 2026/9/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-104 | 徳島支社 | 鳴門変電所 N o . 1 連系変圧器3次箱他取替 | B | 2026/9/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-105 | 愛媛支社 | 石井変電所 N o . 1 ・ 2 電力用コンデンサ除却 | B | 2026/9/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-106 | 徳島支社 | 国府変電所 N o . 3 変圧器制御保護盤取替 | A | 2026/9/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-107 | 徳島支社 | 国府変電所 N o . 2 中性点用接地抵抗器取替 | A | 2026/9/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-108 | 香川支社 | 高松変電所 N o . 2 連系用変圧器2次遮断器他取替 | B | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-109 | 香川支社 | 讃岐変電所 カメラ・センサ他設置 | C | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-110 | 徳島支社 | 井川変電所 計器用変圧器切換盤取替 | B | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-111 | 徳島支社 | 三野変電所 N o . 2 配電用変圧器本体塗装修繕 | A | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-112 | 愛媛支社 | 若宮変電所 6 6 k V 鉄構塗装修繕 | A | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-113 | 愛媛支社 | 卯之町変電所 避雷器取替 | A | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-114 | 愛媛支社 | 西条変電所 6 6 k V 鉄構塗装（母線連絡区画） | A | 2026/9/15 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-115 | 系統運用部 | 総合研修所 187kV母線保護装置移設 | A | 2026/10/1 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-116 | 徳島支社 | 応神変電所 N o . 3 配電用変圧器1次甲乙線路開閉器取替 | A | 2026/10/1 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-117 | 愛媛支社 | 西条変電所 6 k V 移動用ケーブル取替 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-118 | 香川支社 | 香川変電所 N o . 2 連系用変圧器1次引留鉄構塗装修繕 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-119 | 香川支社 | 香川変電所 N o . 3 連系用変圧器1次引留鉄構塗装修繕 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/02 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-120 | 愛媛支社 | 浜田変電所 N o . 2 配電用変圧器仮供給工事（設置） | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-121 | 高知支社 | 介良変電所 N o . 3 配電箱他取替 | C | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-122 | 高知支社 | 伊野変電所 N o . 3 配電用変圧器取替 | B | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-123 | 徳島支社 | 一宇変電所 N - 1 電制用受信装置設置 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-124 | 愛媛支社 | 浜田変電所 6 6 k V 母線区分開閉器他取替 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-125 | 愛媛支社 | 八幡浜変電所 遠方監視制御装置取替 | B | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-126 | 愛媛支社 | 喜多川変電所 受電盤他取替 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-127 | 愛媛支社 | 喜多川変電所 N o . 3 変圧器制御保護盤他取替 | A | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-128 | 愛媛支社 | 喜多川変電所 6 6 k V 計器用変圧器取替 | B | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-129 | 徳島支社 | 脇町変電所 遠方監視制御装置取替 | B | 2026/10/15 | 2026/12 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-130 | 系統運用部 | 高知系制 無停電電源装置取替工事 | B | 2026/10/20 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/02 | 変電・給電-工事 2026-2 |
| 変電・給電-工事 2026-131 | 徳島支社 | 井川変電所 連変N-1電制装置設置工事 | A | 2026/11/1 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-132 | 愛媛支社 | 石井変電所 保護継電装置設置 | A | 2026/11/1 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-133 | 徳島支社 | 雑賀変電所 N o . 1 変圧器制御保護盤取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-134 | 愛媛支社 | 泉川変電所 変流器設置 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-135 | 徳島支社 | 阿南火力変電所 N o . 1 連系用変圧器タップ・クーラー制御盤取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |

| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|-------------------|---------|-------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-136 | 愛媛支社 | 五黒変電所 五黒線遮断器取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-137 | 愛媛支社 | 五黒変電所 送受電盤取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-138 | 愛媛支社 | 五黒変電所 母線用計器用変圧器・避雷器取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-139 | 愛媛支社 | 五黒変電所 五黒線線路開閉器取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-140 | 愛媛支社 | 川内変電所 500kV計器用変圧器切替盤他取替 | B | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-141 | 愛媛支社 | 泉川変電所 No. 3配電用変圧器取替 (I期) | B | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-142 | 香川支社 | 綾南変電所 綾南支線保護継電装置取替 | A | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/07 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-143 | 香川支社 | 高松変電所 緊急系統制御装置端末設置 | B | 2026/11/1 | 2027/01 | 2027/07 | 2028/03 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-144 | 高知支社 | 下知変電所 No. 1配電用変圧器用中性点リアクトル他取替 | B | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-145 | 愛媛支社 | 政枝変電所 No. 3配電用変圧器取替 | B | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-146 | 愛媛支社 | 政枝変電所 No. 3配電用変圧器仮供給工事 | B | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-147 | 高知支社 | 田野変電所 No. 1配電箱取替 | B | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/03 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-148 | 愛媛支社 | 柳瀬変電所 No. 1変圧器制御保護盤取替 | A | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/04 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-149 | 香川支社 | 東浜変電所 設備改良 (II期) | B | 2026/11/15 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-150 | 高知支社 | 小高坂変電所 保護継電装置設置 | A | 2026/12/1 | 2027/01 | 2027/04 | 2027/04 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-151 | 徳島支社 | 大津変電所 遠方監視制御装置取替 | B | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-152 | 徳島支社 | 祖谷変電所 屋外基礎工事 | A | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-153 | 徳島支社 | 祖谷変電所 屋外基礎工事 | B | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-154 | 愛媛支社 | 壬生川変電所 今治線桜井線保護継電装置取替 | A | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-155 | 愛媛支社 | 今治変電所 今治線桜井線保護継電装置取替 | B | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-156 | 愛媛支社 | 富田変電所 桜井線保護継電装置取替 | A | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-157 | 徳島支社 | 鷲敷変電所 No. 2バンク逆潮流対策 | B | 2026/12/1 | 2027/02 | 2027/05 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-158 | 高知支社 | 安芸変電所 No. 4変圧器制御保護盤取替 | A | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-159 | 愛媛支社 | 浜田変電所 No. 2配電用変圧器仮供給工事 (撤去) | A | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-160 | 高知支社 | 鏡川変電所 送電線用計器用変圧器・避雷器取替 | B | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-161 | 愛媛支社 | 保内変電所 保内線仮供給工事 | A | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-162 | 香川支社 | 富士見変電所 線路用計器用変圧器他取替 | A | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-163 | 香川支社 | 坂出変電所 東丸亀線1・2L他線路用計器用変圧器取替 | B | 2026/12/15 | 2027/02 | 2027/04 | 2028/01 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-164 | 徳島支社 | 阿波変電所 橘湾系緊急制御装置取替 (III期) | A | 2027/1/1 | 2027/02 | 2027/04 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-165 | 高知支社 | 江の口変電所 保護継電装置設置 | A | 2027/1/1 | 2027/02 | 2027/05 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-166 | 愛媛支社 | 面一変電所 大面線1・2L線路用計器用変圧器取替 | A | 2027/1/1 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-167 | 高知支社 | 清水変電所 No. 1・3避雷器取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/05 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-168 | 高知支社 | 伊尾木川開閉所 避雷器取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-169 | 高知支社 | 宿毛変電所 No. 1電力用コンデンサ用遮断器他取替 | B | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/07 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |

| 番号 | 事業場・支社別 | 件名 | 規模区分※1 | 応募締切時期(目安)※2 | 見積時期 | 工期 | | 仕様書番号 |
|-------------------|---------|------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 着工 | 竣工 | |
| 変電・給電-工事 2026-170 | 徳島支社 | A変電所 No. 4配電用変圧器増設(Ⅱ期) | B | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/08 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-171 | 高知支社 | 高知変電所 下知線他線路振替 | B | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/11 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-172 | 愛媛支社 | 横林変電所 遮断器取替 | B | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-173 | 愛媛支社 | 横林変電所 66kV線路開閉器取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-174 | 愛媛支社 | 横林変電所 66kV断路器取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-175 | 愛媛支社 | 横林変電所 66kV母線他計器用変圧器取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-176 | 愛媛支社 | 横林変電所 受電盤取替 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-177 | 愛媛支社 | 横林変電所 自動並入・転送遮断装置除却 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-178 | 愛媛支社 | 横林変電所 惣川線関係機器除却 | A | 2027/1/15 | 2027/03 | 2027/07 | 2027/12 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-179 | 徳島支社 | 阿南変換所 橋湾系緊急制御装置取替(Ⅲ期) | A | 2027/2/1 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |
| 変電・給電-工事 2026-180 | 徳島支社 | 阿南変換所 橋湾系緊急制御装置取替(Ⅳ期) | A | 2027/2/1 | 2027/03 | 2027/05 | 2027/06 | 変電・給電-工事共通 2026-1 |

※1 「規模区分」は、当該案件の計画時における金額規模の目安(下表参照)を示しています。

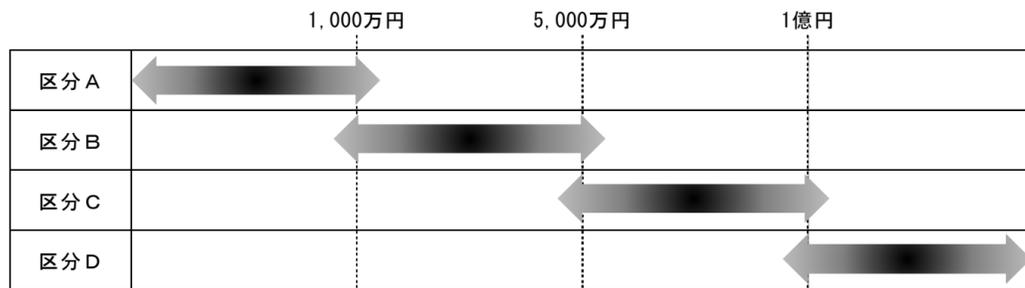

※2 注意事項

- ・当社との新規お取引にあたっては、技術力や保有資格、経営状況等の審査が必要となりますので、業務ごとに設定している締切時期までに応募下さい。
- ・なお、審査状況によっては、締切時期までに応募いただいた場合でも、入札に参加いただけないことがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
